

2ème rapport de travail
(30 avril 2026 au 24 juillet 2026)

**Construction d'un bâtiment comprenant deux salles de
classe, un bureau, un magasin et des toilettes
pour l'école maternelle publique d'Adjigo
Arrondissement d'Atokolibé
Municipalité de Banté
République du Bénin**

Dès que la toiture était terminée, les travaux de plâtrage ont commencé.
Le sable était tamisé. Les portes et les volets étaient installés.



Les maçons ont ensuite commencé à enduire le bâtiment. Ils ont commencé à
l'intérieur des pièces.




Les panneaux ont été installés.

Ensuite, les murs extérieurs ont été enduits.



Ensuite, les sols ont été compactés et cimentés.

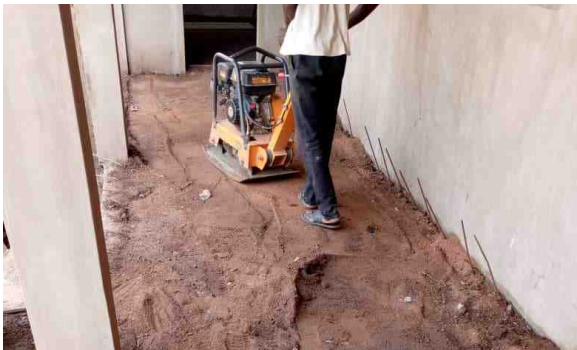

Une armature en fer a été installée dans le sol de la véranda. Après le cimentage, les cimentages ont été traités avec un rouleau à picots.



Les balcons de la rampe ont été placés. Les marches ont été cimentées.



Les grillages antivols ont été installés.




Finalement, la faîtière du toit a été fermée.



La fosse des toilettes était enfin prête et pouvait être revêtue de briques.



Les murs ont été enduits avec du Sikalite et du Sikalatex et scellés.

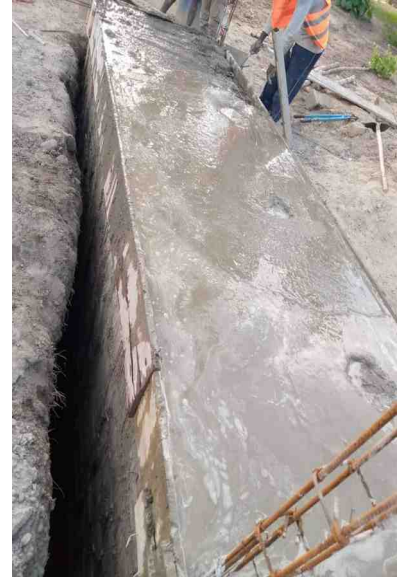

Le bloc sanitaire a ensuite été construit par-dessus.



Il a fallu laisser sécher le plâtre pendant un mois avant que les peintres puissent commencer leur travail.

Enfin, le 24 juin l'équipe des peintres est arrivée. Les murs furent frottés.



Après l'application de la première couche de peinture, le bâtiment s'est peu à peu coloré.



Les salles s'animent également.




Les toilettes, aussi, étaient peintes.



Et voilà, les fresques sont terminées.





Les logos ont également été peints.



Les vacances scolaires ayant lieu jusqu'à la mi-septembre, la cérémonie d'ouverture a été reportée à la fin septembre, Je remercie sincèrement tous mes amis, et plus particulièrement un ami bavarois, pour leur soutien.

Astrid Toda
