

1^{er} Rapport de travail
(5 décembre 2025 au 10 mars 2026)

**Construction d'un bâtiment comprenant 4 salles de classe,
un bureau, un magasin et des toilettes
pour l'école maternelle publique de Wakou Tebo
Arrondissement d'Oroukayo
Commune de Kouandé
République du Bénin**

Nous sommes arrivés à Wakou Tebo dans la nuit du 4 décembre 2025. Les villageois n'avaient rien préparé, ne croyant pas aux annonces de la directrice. Trop d'organisations avaient promis leur aide sans suite. Ils n'étaient jamais retournés dans ce village isolé. Aussi, les habitants furent-ils surpris de nous voir arriver avec toute l'équipe de construction, les brouettes et les barils d'eau. Ils installèrent à la hâte des abris provisoires pour les ouvriers. Une fois tout en place, le président de l'ONG, la responsable à la condition féminine et moi-même avons pris la route pour Kouandé et nous sommes installés dans un petit hôtel.

Le lendemain, à 10 heures, nous sommes arrivés ponctuellement à Wakou Tebo, reposés après une bonne nuit de sommeil, pour l'assemblée générale. Les villageois étaient déjà là, des bancs et des chaises étaient installés sous les arbres. Le maire de Kouandé était également présent. Nous avons deux interprètes, l'un pour les Bariba et l'autre pour les Poehl. L'accord a été lu à haute voix comme d'habitude, mais cette fois-ci, le maire a pris l'initiative et l'a expliqué avec conviction. Il a démontré qu'il connaissait parfaitement l'accord et qu'il y adhérerait pleinement. Lorsque des questions ont été posées, nous avons pu y répondre. Ensuite, un vote a eu lieu.





Les écoliers portaient des ardoises avec des messages de bienvenue.

Après la réunion, nous avons rassemblé le nécessaire (planches, bois de teck et clous) pour construire la chaise. Le président et le ferrailleur sont partis à la recherche de ciment et de fer. Le ciment s'est avéré difficile à trouver, mais heureusement, un magasin de Kouandé en avait commandé 50 tonnes, et la livraison était déjà en route. Ils ont donc acheté les 50 tonnes et en ont commandé la même quantité. Pour le fer, ils ont dû se rendre jusqu'à Perma. Le maire a proposé son aide pour l'achat de sable et de gravier. Finalement, tout s'est réglé plus vite que prévu.

Sur le chantier, nous avons constaté qu'il fallait d'abord brûler le sol pour éliminer les termites. Ensuite, nous avons placé la chaise.



Du sable et du gravier ont été livrés.



Du fer est arrivé



Comme il n'y avait pas d'espace à Wakou Tebo où stocker notre matériel, nous avons décidé de construire un hangar en tôle ondulée.



La population locale entreprit aussitôt des travaux de fouilles. Le sol se révéla très dur et cristallin, composé de « pierres » formées de nombreux petits cristaux. Les hommes étaient extrêmement motivés et persévérants.



Les femmes ont apporté de l'eau.



Nous avons engagé une entreprise pour faire un forage. Les résultats du forage s'étant révélés négatifs, les personnes concernées ont disparu. Nous avons tenté de les retrouver, mais en vain. Pendant ce temps, les habitants nous ont approvisionnés en eau d'une source naturelle d'un bas fonds, qu'ils transportaient sur un tricycle.



Les maçons fabriquaient les briques et les ferrailleurs les éléments en fer.




Une fois les tranchées de fondation creusées, du béton armé a été coulé pour former la base des fondations et les piliers ont été alignés.



Une seconde couche de béton a été coulée par-dessus. Les murs ont ensuite été érigés sur les fondations.



Le lendemain, les murs avaient déjà atteint la hauteur du chaînage de bas.

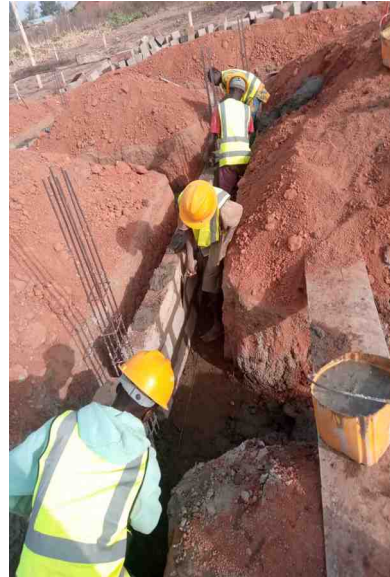

Le chaînage de bas a été coulé.



Les murs continuaient de s'élever jusqu'au chaînage sous les ouvertures des fenêtres.



Die Mauern erreichten schon bald den Fenstersturz. Der obere Eisenanker wurde gegossen.



Les murs furent surélevés, et le dernier chaînage sous la toiture fut coulée par-dessus. Les pignons furent ensuite érigés.



Les fins des piliers furent coulés et les petits murs sous le toit furent construits.



Finalement, la rampe, les escaliers et le mur de protection contre l'érosion ont été construits.



Pendant que les murs du bâtiment séchaient, les toilettes furent construites.



Une fois la fosse septique enduite de Sikalite et de Sikalatex, elle a été scellée et le bâtiment des toilettes a été construit par-dessus.




Un abri a été construit à côté du bâtiment où les enfants peuvent faire leurs exercices le soir à la lumière d'un projecteur solaire.



Les charpentiers sont arrivés.



Les madriers découpés ont été transportés sur le chantier et traités avec un insecticide.

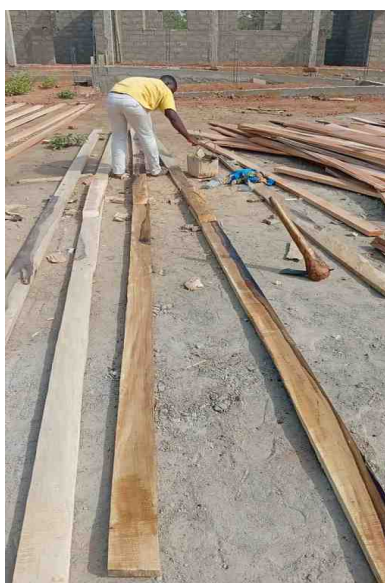

Les fermes ont été construites, les poutres longitudinales posées, et les tuiles vissés.



La toiture a été terminée en un rien de temps.



Je remercie tous ceux qui nous accompagnent dans ce projet.
Astrid Toda
