

2. Arbeitsbericht

(30. April 2026 bis 24. Juli 2026)

zum Bau von einem Gebäude mit 2 Klassenräumen, Büro, Lagerraum und Toiletten für die öffentliche Vorschule von Adjigo Regierungsbezirk Atokolibé Gemeinde von Banté Republik Benin

Kaum dass das Dach fertig war, begannen die Verputzarbeiten.
Der Sand wurde gesiebt. Türen und Fensterläden wurden eingesetzt



Dann begannen die Maurer das Gebäude zu verputzen. Sie begannen im Inneren der Räumen.




Die Tafeln wurden angelegt

Danach wurden die Außenwände verputzt



Als nächstes wurden die Böden kompaktiert und zementiert.

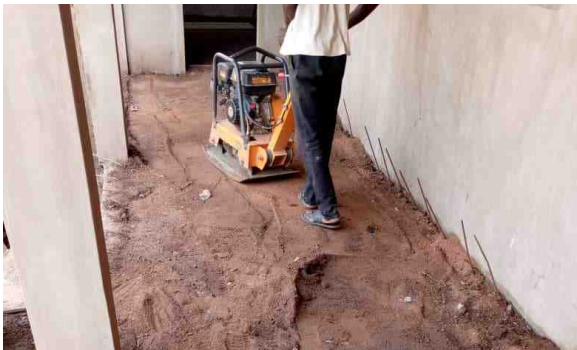

In den Boden der Veranda wurde eine Eisenverstärkung eingebaut. Nach dem Zementieren wurden die Böden mit einer Noppenwalze behandelt.



Das Geländer der Rampe wurde eingebaut. Die Stufen wurden zementiert.



Der Einbruchschutz wurde angebracht




Zum Schluß wurde noch der Dachfirst geschlossen



Auch die Toilettengrube war endlich bereit und konnte ausgemauert werden



Die Mauern wurden mit Sikalite und Sikalatex verputzt und verschlossen.

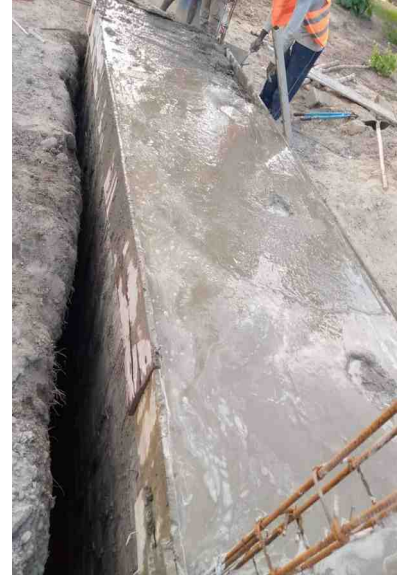

Darauf wurden das Toilettenhäuschen errichtet



Der Putzt musste einen Monat trocknen, ehe die Maler mit ihrer Arbeit beginnen konnten.

Am 24. Juni war es so weit. Die Wände wurden abgerieben.




Nachdem die erste Farbschicht aufgetragen wurde, wurde das Gebäude langsam farbig.



Auch in den Räumen wurde es lebendig.




Das Toilettenhäuschen bekam Farbe.

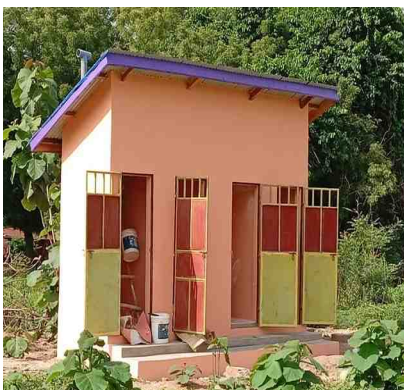

Und schließlich sind die Wandbilder fertig.





Auch die Logo wurden angemalt.



Die Eröffnungsfeier wird auf Ende September verlegt, da bis Mitte September Ferien sind.
Von ganzem Herzen danke ich allen Freunden und besonders einem Freund aus Bayern für die Unterstützung.
Astrid Toda
