

2. Arbeitsbericht

(22. März 2026 bis 31. juli 2026)

zum Bau eines Gebäudes mit 4 Klassenräumen, Büro, Lagerraum und Toiletten für die öffentliche Vorschule von Wakou Tebo Regierungsbezirk Oroukayo Gemeinde von Kouandé Republik Benin

Die Maurer kehrten an die Baustelle zurück Und setzten als erstes die Türen und Fensterläden ein. Danach begannen die Verputzarbeiten.



Zu erst wurden die Räume im Inneren verputzt, anschließend außen.



Auch das Geländer der Rampe wurde angebracht.

Schliesslich wurden die Böden zementiert.



Einige Maurer arbeiteten in der Zwischenzeit am Toilettenhäuschen.




Für den Wasserturm wurde die Fundamentunterlage gegossen und die Pfeiler darin eingearbeitet.





Mit starken Eisen wuchs der Turm in die Höhe. Die Wasserspeicher wurden installiert

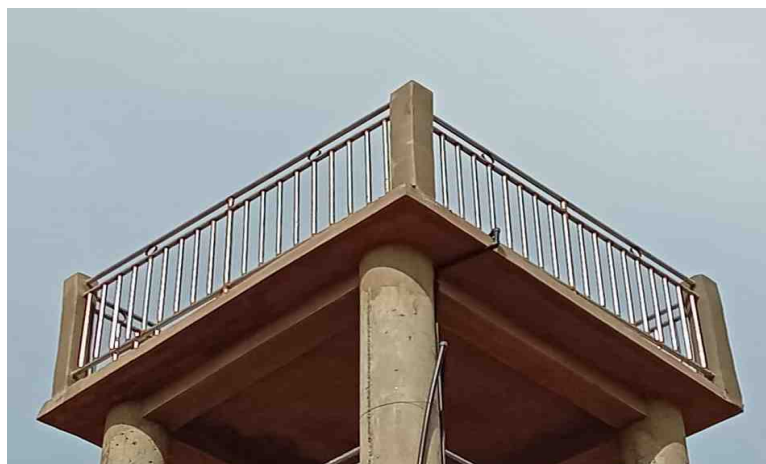

Die Geländer wurden eingebaut



Der Wasserturm wurde vor Eindringlingen geschützt.

Die Wasserzapfstellen wurden gebaut.



Nach einer einmonatigen Trockenpause trafen die Maler ein.



In nur wenigen Tagen veränderte die Schule ihr Erscheinungsbild.



Auch das Toilettenhäuschen wurde angemalt. Jede Kabine bekam eine andere Farbe.



Zum Schluss wurden die Logo angemalt



Wir danken allen Freunden und Unterstützern, die uns beständig zur Seite stehen und den neuen Freunden, die uns gerade erst kennenlernten. Das Projekt in Wakou Tebo ist das nördlichst, das wir im Benin durchgeführt haben. Vor einigen Jahren haben wir ein Schulgebäude im Wüstensand des Niger gebaut. Die nördlichen Regionen haben ihre eigene Gebräuche und Gesetzhlichkeiten. Es war uns eine Ehre, in ihrem Kreis aufgenommen zu werden. Die Zusammenarbeit und Freundschaft hat uns tief berührt. Ich schicke ein herzliches "Danke Schön" nach Wakou Tebo. Die Eröffnungsfeier wird zu Beginn des neuen Schuljahres stattfinden.
Herzlich
Astrid Toda
