

2em Rapport de travail
(22. Mars 2026 au 31. Juillet 2026)

**construction d'un bâtiment avec 4 salles de classe, un
bureau, un magasin et des toilettes
pour l'école maternelle publique de Wakou Tebo
Arrondissement d'Oroukayo
Commune de Kouandé
République du Bénin**

Les maçons sont retournés sur le chantier et ont d'abord installé les portes et les volets. Puis les travaux de plâtrage ont commencé.



On a d'abord enduit les salles intérieures, puis l'extérieur.



La rambarde de la rampe a également été installée.

Finalement, les sols ont été cimentés.



Pendant ce temps, des maçons travaillaient sur le bloc sanitaire.




Les fondations du château d'eau ont été coulées et les piliers y ont été intégrés.





La chateau s'grandissait grâce à de solides supports en fer. Les réservoirs d'eau furent installés.

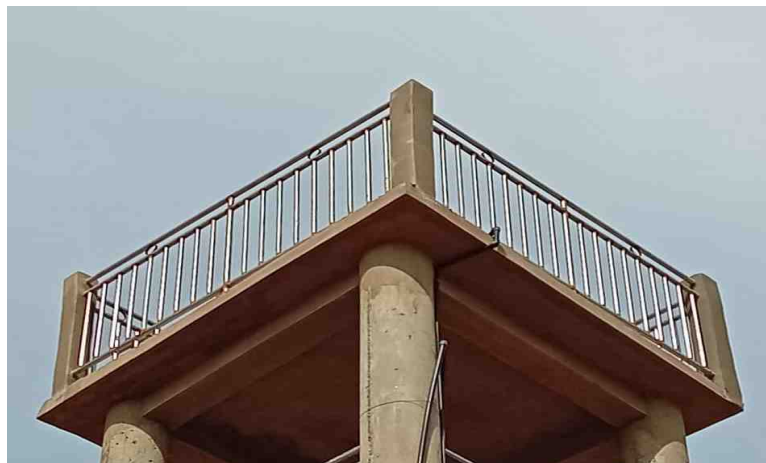

Les balcons ont été installées.



Le château d'eau était protégé des intrus.

Les points d'eau ont été construits.



Après un mois de séchage, les peintres sont arrivés.



En quelques jours seulement, l'école a changé d'apparence.



Les toilettes ont également été repeintes. Chaque cabine a reçu une couleur différente.



Enfin, les logos ont été peints.



Nous remercions tous nos amis et personnes, qui nous ont soutenus et qui nous ont toujours été fidèles, ainsi que nos nouveaux amis. Le projet de Wakou Tebo est le plus septentrional que nous ayons entrepris au Bénin. Il y a quelques années, nous avons construit une école dans le désert du Niger. Les régions du nord ont leurs propres coutumes et lois. Ce fut un honneur d'être accueillis au sein de leur communauté. Leur coopération et leur amitié nous ont profondément touchés. J'adresse mes plus sincères remerciements à Wakou Tebo.

La cérémonie d'ouverture aura lieu au début de la nouvelle année scolaire.

Cordialement

Astrid Toda
