

1. Rapport de travail

(8 janvier 2026 - 4 juin 2026)

Construction de deux bâtiments de quatre salles de classe chacun, avec des toilettes, plus un approvisionnement en eau

**pour le Collège d'Enseignement Général de Bobè
Arrondissement de Bobè
Commune de Bantè
République du Bénin**

Le 8 janvier 2026, nous nous sommes rencontrés à Bobè pour discuter de l'approvisionnement en eau avec l'entreprise contractante. Celle-ci a promis de forer le puits la semaine suivante.



Le 20 janvier 2026, le président de notre association, la responsable de la condition féminine et moi-même sommes partis pour Bantè. Nous avons passé la nuit afin d'arriver à Bobè à temps pour l'assemblée générale avec les habitants, prévue à 10 h. Les villageois étaient déjà réunis. Le chef d'arrondissement, le roi et d'autres personnalités respectées du village étaient également présents. Nous nous sommes présentées et avons expliqué le but de notre venue. Les habitants ont été ravis. Nous avons ensuite lu et traduit le contrat. Les villageois ont posé des questions sur tout point qu'ils ne comprenaient pas. Une fois toutes les questions résolues, un vote a été organisé pour décider de la mise en œuvre du projet conformément aux termes du contrat. Les villageois ont voté en faveur du projet.



Après le vote, nous avons visité le site et demandé aux gens de préparer le terrain pour la construction.

Nous avons examiné et discuté des différentes options pour le stockage des matériaux de construction. Un local de stockage était trop éloigné, un autre trop petit. L'idée est parvenue de construire un hangar de stockage en tôle ondulée sur le chantier.

Le lendemain, nous sommes retournés à Bobè pour l'installation des chaises des deux bâtiments. Aux emplacements prévus, seuls les arbustes et les herbes avaient été superficiellement débroussaillés. Nous avons demandé aux habitants d'enlever les racines avant le lendemain.

Le Président du Conseil d'Administration, avec le ferrailleur et le coffreur se mettaient alors en quête des premiers matériaux. Les rondins de teck et les planches de coffrage sont arrivés avant la tombée de la nuit. L'achat du ciment et du fer s'avéra plus difficile. Mais la chance nous souriait. Nous avons rencontré un fournisseur qui venait de commander 50 tonnes de ciment et plusieurs tonnes de fer. Les deux marchandises étaient en route de Cotonou à Bantè. Nous avons acheté le tout et demandé aussitôt au fournisseur de commander 50 tonnes de ciment supplémentaires. Nous nous sommes donc dépêchés d'acheter de la tôle ondulée afin que le hangar soit construit à temps pour abriter les 50 tonnes de ciment.



La chaise a été créée.



La population a commencé à creuser les tranchées de fondation, ce qui exigeait une grande force. Le sol est très dur.



Les ferrailleurs ont fabriqué les inserts en fer.



Des briques déjà fabriquées

Une fois les tranchées de fondation creusées, elles ont été élargies aux endroits où les piliers devaient être implantés.



La première couche de béton a été coulée, et les piliers ont été alignés sur cette base.




La deuxième couche de béton a été coulée sur laquelle les murs de fondation ont ensuite été construits.


Bientôt, les murs de fondation ont atteint le gazon et le chaînage de bas est coulé.



Un petit chaînage a été coulé sous les ouvertures des fenêtres. Les travaux sur le deuxième bâtiment ont progressé plus lentement. Les électriciens ont installé la mise à la terre.

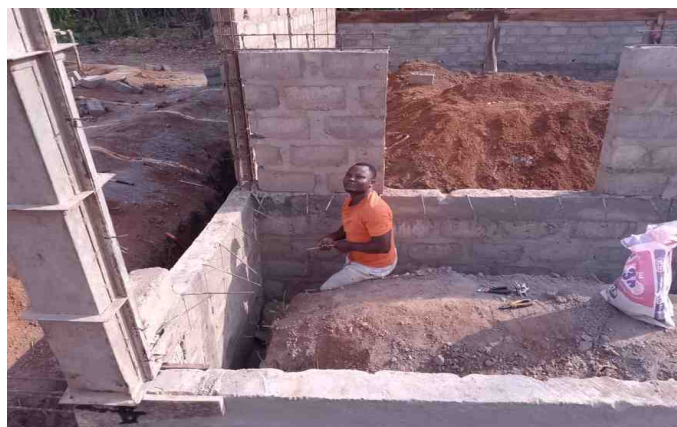

Les piliers de la véranda ont été coulés. Les escaliers ont été construits.

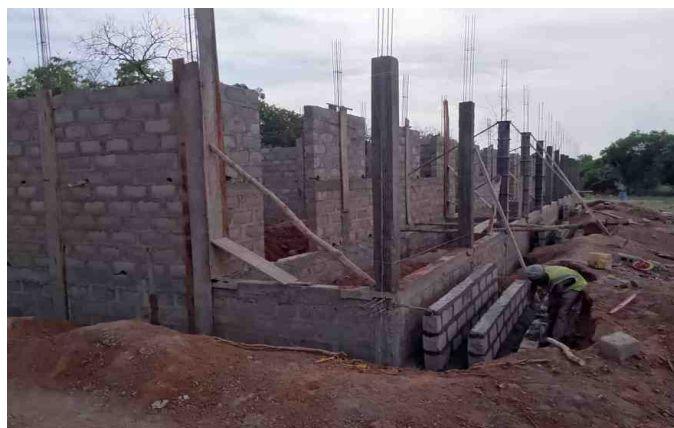

Nous avons eu une chance incroyable et avons réussi à intercepter un conteneur de tuiles avant son déchargement chez notre vendeur. Après discussion avec l'entreprise de vente des tuiles et le chauffeur du camion a poursuivi sa route directement vers Adjigo et Bobè. La route menant à Bobè étant en mauvais état, les tuiles ont été déchargé dans un camion plus petit pour Bobè.



Pendant que nous étions occupés par le déchargement des tuiles, le chaînage de haut du bâtiment a été préparé et coulé en une seule pièce.



Ensuite, les murs ont été surélevé par 4 rangées de blocs de construction.



Ensuite, le chaînage sous le toit était coulé et les pignons étaient érigés.



Une fois les extrémités des piliers coulées et les blocs de construction posés sous le toit, la fête du pignon fut célébrée avec une grande joie.



Finalement, la rampe, les escaliers et les murs de protection contre l'érosion ont été construits.



Le château d'eau a également été construit.



Les bâtiments devaient sécher pendant un mois avant que la toiture puisse être posée. Durant cette période, les habitants étaient censés remplir les salles de classe de sable pour le remblai. De manière générale, la population locale était très réticente à venir sur le chantier. Les gens venaient chercher de l'eau, mais participer à la construction était pas vraiment de leur désir. Finalement, nous leur avons seulement donné d'eau en échange de leur travail. Nous avons dialogué avec les habitants tout au long des travaux et sollicité l'aide des notables locaux. Mais lorsque notre équipe a quitté le chantier, plus rien ne s'est passé. Nous nous sommes donc concentrés sur d'autres projets de construction. Lorsque nous avons cessé de venir, les habitants de Bobè se sont inquiétés et ont finalement commencé à remplir les salles de classe.

Finalement, les charpentiers sont arrivés et ont terminé les toitures. Les poutres ont été enduites d'insectifuge et les fermes ont été fabriquées.



Les chevrons ont été posées.



Les toits étaient couverts.



J'adresse mes plus sincères remerciements à l'Allemagne et aux deux écoles partenaires du sud du Bénin, ainsi qu'au lycée d'Erft. en 2025 et 2026, nous avons organisé deux courses de dons dans les CEG : Gbétagbo en 2025 et Adjagbo en 2025. Le lycée d'Erft. a lancé sa course de dons en septembre 2025. Les fonds récoltés grâce à ces trois écoles ont permis de couvrir 25 % du coût total de la construction d'un bâtiment.


Les 25 % du deuxième bâtiment ont été offerts par une athlète féminine de renom qui souhaite rester anonyme.

Les 75 % restants ont été financés, comme d'habitude, par le BMZ (ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement) grâce à l'argent des contribuables allemands. Je remercie tous ces donateurs, que je ne connais même pas !

Avec gratitude
Astrid Toda

La course aux dons au CEG Gbetagbo
République du Bénin
Une Action Du Partage de Bonheur

Course aux Dons 2025

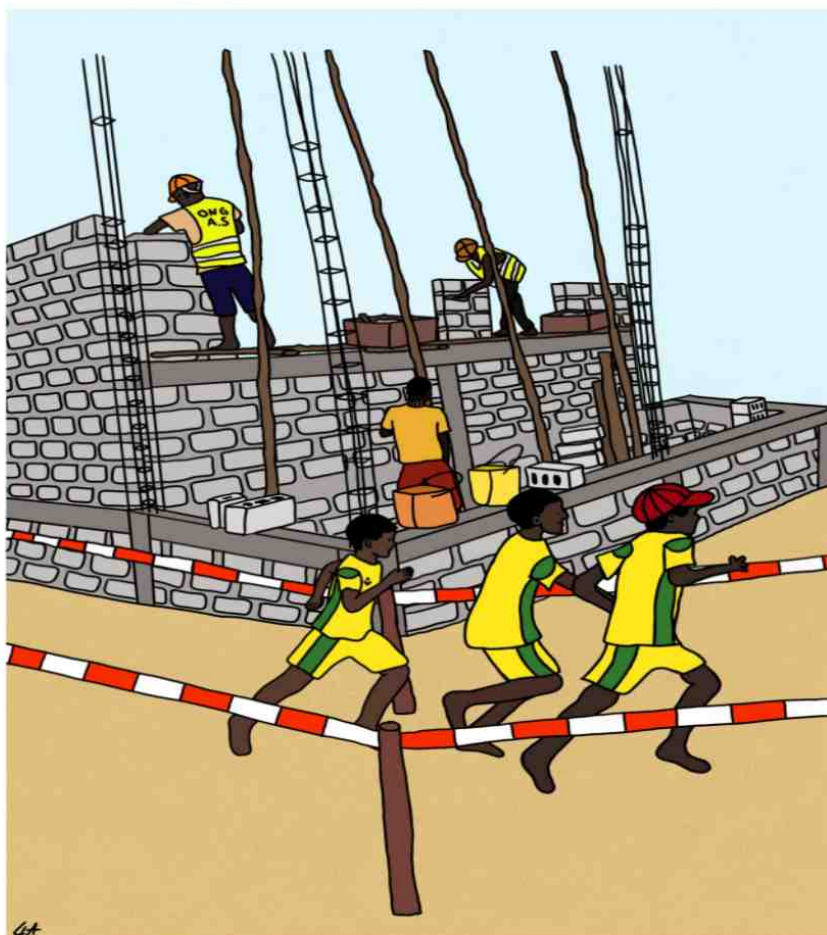

CEG Gbetaabo

La première « course aux dons » aura lieu **le 31 mai 2025, à 09 heures dans la matinée sur le terrain de sport du CEG Gbétagbo**, dans l'Arrondissement d'Akassato de la commune d'Abomey-Calavi.

Les élèves du CEG Gbétagbo veulent exprimer leur solidarité à un collège de la commune de Bantè qui ne dispose pas de bâtiment scolaire permanent.

Ils donnent l'exemple de solidarité et de fraternité à tous les autres enfants du Bénin et ils espèrent que d'autres enfants suivront leurs pas.

Leur devise :

Il fait plus de plaisir d'être heureux ensemble que seul.

UNE ACTION DE PARTAGE DE BONHEUR

Course aux dons 2026



PARTAGE AVEC LE CEG BOBÈ
